

**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2014 г.**

2014 год

Плановые показатели				Факт	
832 человека	69 домов	447 помещений	15,38 тыс. кв. м. расселяемой площади	275 человек/ 5,448 тыс.кв.м.	35 %

21 поселение в 14 муниципальных районах

37 домов

Завершен нулевой цикл

г. Боровичи - 1
Тёсово-Нетельское с.п. - 1
Всего – 2 дома


Завершено строительство

Маловишерское г.п.-2
Тёсово-Нетельское с.п. – 1
Уторгошское с.п. – 1
Чудовское г.п. - 1
Яжелбицкое с.п. – 1
г. Валдай – 1
Короцкое с.п. – 1
Парфинское г.п. – 1
г. Старая Русса - 1
Пролетарское г.п. - 1
Всего домов – 11

Реализованы
программные
мероприятия

Великосельское с.п. - 1
Калининское с.п.- 4
Кневицкое с.п. – 1
Любытинское с.п. - 1
Мошенское с.п. – 10
Песское с.п. – 1
Пестовское .п. - 3
Хвойнинское г.п. -1
Окуловское г.п. – 1
Большевишерское г.п. -1
Всего домов – 24

г.Боровичи

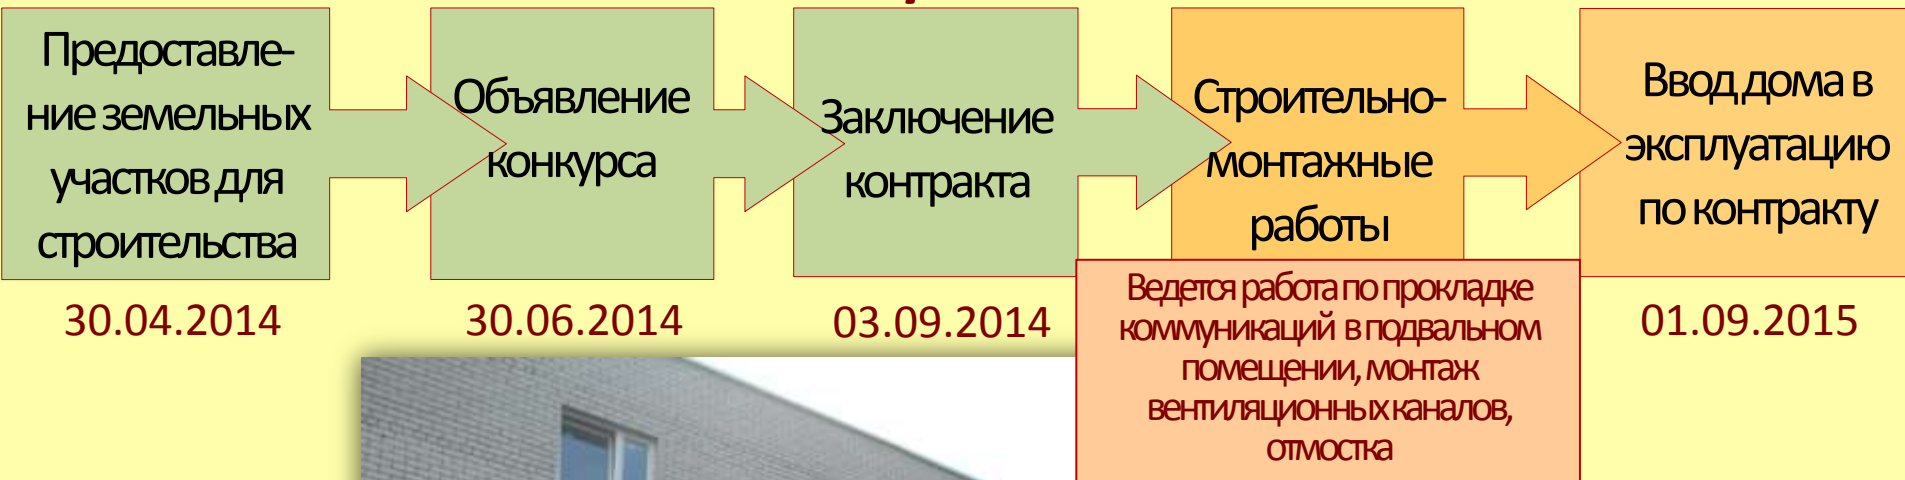

Количество переселяемых граждан – **84**

Количество расселяемых помещений – **34**

Расселяемая площадь – **1147,74** кв.м.

Валдайское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

02.07.2014

Объявление конкурса

21.06.2014

Заключение контракта

25.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка, благоустройство территории

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

15.06.2015



Количество переселяемых граждан – **57**

Количество расселяемых помещений – **41**

Расселяемая площадь – **1284,02 кв.м.**

Короцкое сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

15.07.2014

Заключение контракта

15.08.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка помещений, благоустройство территории

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.07.2015



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **16**

Расселяемая площадь – **553,5 кв.м.**

Парфинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

11.04.2014

Объявление
конкурса

18.06.2014

Заключение
контракта

24.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Внутренняя отделка

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

25.12.2014



Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **972,8 кв.м.**

Пролетарское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

01.02.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

12.08.2014

Строительно-монтажные работы

1. Внутренняя отделка, установка оконных блоков

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.08.2015



Количество переселяемых граждан – **125**

Количество расселяемых помещений – **69**

Расселяемая площадь – **1976,5 кв.м.**

г. Старая Русса



Количество переселяемых граждан – **31**

Количество расселяемых помещений – **10**

Расселяемая площадь – **399,5 кв.м.**

Тёсово-Нетильское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

30.04.2014

Объявление
конкурса

30.06.2014

Заключение
контракта

28.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

1. Стены 3-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

31.12.2014



Количество переселяемых граждан — **63**

Количество расселяемых помещений — **37**

Расселяемая площадь — **1499,16 кв.м.**

Яжелбицкое сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

15.07.2014

Объявление
конкурса

22.09.2014

Заключение
контракта

06.11.2014

Строительно-
монтажные
работы

Внутренняя отделка
помещений,
благоустройство
территории.

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

25.06.2015



Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **254,4 кв.м.**

№	Муниципальное образование	Количество переселяемых граждан	Количество расселяемых домов	Количество расселяемых помещений	Площадь (кв.м.)		Ход реализации
					общая	расселяемая	
1.	г. Боровичи	45	5	31	1131,5	798,1	02.06.2015 заключен муниципальный контракт на приобретение 13 жил. пом.; 11.06.2015 заключен муниципальный контракт на приобретение 19 жил. пом. Приобретение помещений в строящемся доме по этапу 2014 г.
2.	Бронницкое с.п.	12	1	5	155,7	117,7	Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций
3.	Тесово-Нетыльское с.п.	28	2	13	799,2	605,1	Частично заключены муниципальные контракты
4.	Пролетарское г.п.	177	15	95	4175,6	3577,9	1 дом, кирпичный–монтаж кровли, установка оконных блоков, срок исполнения контракта 31.08.2015; 1 дом, кирпичный – фундамент, срок исполнения контракта 31.08.2015
5.	Валдайское г.п.	51	9	29	1547,2	930,77	1 дом (II очередь), кирпичный, 3-х этажный–устройство крыши, срок исполнения контракта 30.12.2016
6.	Выбитское с.п.	29	2	10	1217,7	468,2	1 дом, кирпичный – фундамент, срок исполнения контракта 15.12.2016
7.	Горское с.п.	46	3	21	1149,8	865,9	15.06.2015 заключено 5 контракта, срок исполнения – 15.12.2015.
8.	с.п. Волот	26	3	16	718,7	698,7	Конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций (план заключения контракта- 3.07.2015, 12.07.2015)

№	Муниципальное образование	Количество переселяемых граждан	Количество во расселяемых домов	Количество расселяемых помещений	Площадь (кв.м.)		Ход реализации
					общая	расселяемая	
9.	Любытинское с.п.	17	2	9	872,2	454,0	Завершены программные мероприятия
10.	Маловишерское г.п.	199	14	102	3784,7	3484,4	Частично заключены муниципальные контракты. 1 дом-стены 2-го этажа, 1 дом-фундамент, 1 дом проводятся конкурсные процедуры по предоставлению земельного участка, фундамент
11.	Медведское с.п.	8	1	3	1495,1	153,7	1 дом, кирпичный, срок исполнения контракта 30.11.2015.
12.	Парфинское г.п.	38	3	20	992,3	734,15	Заключены 2 контракта на приобретение жилых помещений у застройщика, срок исполнения контракта 01.11.2015.
13.	г. Старая Русса	76	10	37	1596,9	1323,5	Частично заключены муниципальные контракты
14.	Чудовское г.п.	11	1	7	352,1	306,7	Заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений у застройщика, срок исполнения – 30.06.2015
ИТОГО		766	71	398	19988,7	14512,82	

2015 год

Плановые показатели				Факт	
766 человек	71 дом	398 помещений	14,513 тыс. кв. м. расселяемой площади	1 человек/ 0,03 тыс.кв.м.	0,2 %

23 МКД в 14 поселениях

**Ведется строительство,
заключены
муниципальные
контракты**

16 МКД

*г. Боровичи-1
Тёсово-Нетельское с.п.-1
Парфинское г.п.-1
Выбитское с.п.-1
г.Старая Русса-1
Пролетарское г.п.-2
Маловишерское г.п.-2
Горское с.п. – 5
с.п. Волот - 1
Медведское с.п.-1*

**Завершены
строительно-
монтажные работы**

3 МКД

*Валдайское г.п.-1
Чудовское г.п.-1
Любытинское с.п.-1*

**Проводятся
конкурсные
процедуры по
отбору
подрядной
организации**

2 МКД

*Бронницкое с.п.-1
с.п. Волот - 1*

**Проводятся
конкурсные
процедуры по
предоставлению
земельного
участка под
строительство**

2 МКД

*г. Старая Русса-1
Маловишерское
г.п.-1*

Бронницкое сельское поселение

Реконструкция
здания

Объявление
аукциона на
приобретение

22.06.2015




Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **5**

Расселяемая площадь – **111,7** кв. м.

г.Боровичи

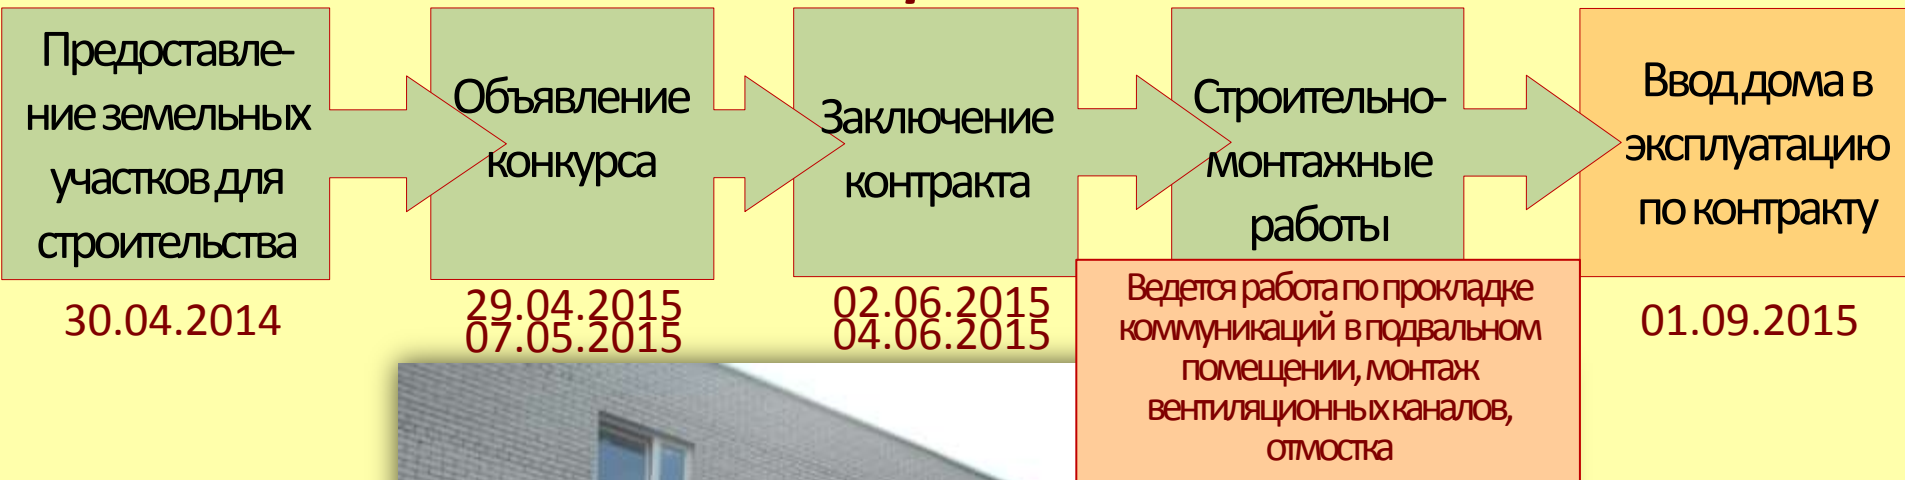

Количество переселяемых граждан – **45**

Количество расселяемых помещений – **31**

Расселяемая площадь – **798,1** кв.м.

Валдайское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

02.07.2014

Объявление конкурса

08.02.2015

Заключение контракта

10.03.2015

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка, установка оконных блоков, благоустройство территории

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.12.2016



Количество переселяемых граждан – **51**

Количество расселяемых помещений – **29**

Расселяемая площадь – **930,77 кв.м.**

Волотовское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

апрель 2014

Объявление конкурса

05.05.2015
25.05.2015

Заключение контракта

03.07.2015
план: 12.07.2015

Строительно-монтажные работы

Стены 1-ого этажа
Фундамент



Количество переселяемых граждан – **26**

Количество расселяемых помещений – **16**

Расселяемая площадь – **698,7 кв.м.**

Выбитское сельское поселение

Предоставлен
ие земельного
участка под
строительство

09.04.2015

Объявление
аукциона
на участие в
долевом
строительстве

28.04.2015 –
15.05.2015

Заключение
контракта

01.06.2015
09.06.2015
15.06.2015

Строительно-
монтажные
работы

Фундамент

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

15.12.2016



Количество переселяемых граждан – **29**

Количество расселяемых помещений – **10**

Расселяемая площадь – **468,2 кв.м.**

Горское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

апрель 2014

Объявление
конкурса

17.04.2015

Заключение
контракта

15.06.2015

Строительно-
монтажные
работы

Земляные работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

15.12.2015



Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **21**

Расселяемая площадь – **865,9 кв.м.**

Любытинское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

11.04.2014

Объявление
конкурса

10.03.2015

Заключение
контракта

19.03.2015

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

29.06.2015



Количество переселяемых граждан – **17**

Количество расселяемых помещений – **9**

Расселяемая площадь – **454,0 кв.м.**

Маловишерское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

апрель 2015
апрель 2015
май 2015

Объявление
конкурса

20.04.2015
11.05.2015
10.03.2015

Заключение
контракта

05.05.2015
23.06.2015

Строительно-
монтажные
работы

Фундамент
Стены 2-го этажа
Фундамент

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

30.11.2016
25.12.2015



Количество переселяемых граждан – **199**

Количество расселяемых помещений – **102**

Расселяемая площадь – **3484,4 кв.м.**

Медведское сельское поселение

Предоставлен
ие земельного
участка под
строительство

07.04.2015

Объявление
аукциона
на участие в
долевом
строительстве

23.04.2015

Заключение
контракта

29.06.2015

Строительно-
монтажные
работы

Фундамент

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

30.11.2015



Количество переселяемых граждан – **8**

Количество расселяемых помещений – **3**

Расселяемая площадь – **153,7 кв.м.**

Парфинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

31.03.2014

Объявление
конкурса

28.02.2015

Заключение
контракта

31.03.2015

Строительно-
монтажные
работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

01.11.2015



Количество переселяемых граждан – **38**

Количество расселяемых помещений – **20**

Расселяемая площадь – **734,15 кв.м.**

Пролетарское городское поселение

Предоставлен
ие земельного
участка под
строительство

01.02.2014

Объявление
аукциона
на участие в
долевом
строительстве

27.06.2014
апрель 2015

Объявление
аукциона
на участие в
долевом
строительстве

12.08.2014
08.06.2015

Строительно-
монтажные
работы

1. Внутренняя отделка,
установка оконных блоков,
монтаж кровли
2. Фундамент

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

31.08.2015
31.12.2016



Количество переселяемых граждан – **182**

Количество расселяемых помещений – **96**

Расселяемая площадь – **3600,9 кв.м.**

Чудовское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.04.2014

Объявление конкурса

28.06.2014

Заключение контракта

18.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка помещений, благоустройство территории

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.06.2015



Количество переселяемых граждан – **11**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **306,7 кв.м.**
