



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ  
КОМПЛЕКСУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда**

*Докладчик: Николаева Ирина Юрьевна,  
руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК  
Новгородской области*

2014 год

# Оценка хода реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ



## ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Информация предоставлена на 04.08.2014

1. РАБОТ СЪЕЗДИТЕЛИ 2. АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 3. КОНТРАКТЫ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

В этом разделе предоставлены данные о выполнении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации. В таблице указаны субъекты, в которых реализуются программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году. В таблице указаны субъекты, в которых реализуются программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году.

Субъекты Российской Федерации

дата расчета: дата: 04.08.2014

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

Новгородская область

**Место – 25 (по состоянию на 18.08.2014)**  
**Показатель выполнения программы – 95,29 %**  
**Объем финансирования – 1573,14 млн.руб.**  
**Лимит средств Фонда – 737,81 млн.руб.**  
**Площадь аварийного жилищного фонда – 54,88 тыс.м²**  
**Численность переселяемых граждан – 3592 чел.**

**Новгородская область**



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС




Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС

Фонд РЖС

# 2013 год

Плановые показатели				Факт	
649 человек	53 дома	296 помещений	10,4 тыс. кв. м. расселяемой площади	239 человек/ 3,805 тыс.кв.м.	37%

10 поселений и городской округ

Реализованы программные мероприятия	Введены в эксплуатацию	Завершены строительно-монтажные работы	Ведутся строительно-монтажные работы
г. Старая Русса Холмское г.п. Мошенское с.п. Окуловское г.п. Пестовское г.п.	г. Боровичи – 2 Большевишерское г.п.-2 Маловишерское г.п. - 2 ВСЕГО – 6 домов	Маловишерское г.п. – 1 Батецкое с.п. – 1 Крестецкое г.п. – 1 ВСЕГО – 3 дома	Великий Новгород-1 Крестецкое г.п. – 1

## ***Батецкое сельское поселение***

Объявление  
конкурса

октябрь 2013 г.

Заключение  
контракта

10.12.2013

Строительно-  
монтажные  
работы

Внутренняя отделка

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

01.10.2014




Количество переселяемых граждан – **19**

Количество расселяемых помещений – **12**

Расселяемая площадь – **220,6 кв.м.**

# Маловишерское городское поселение

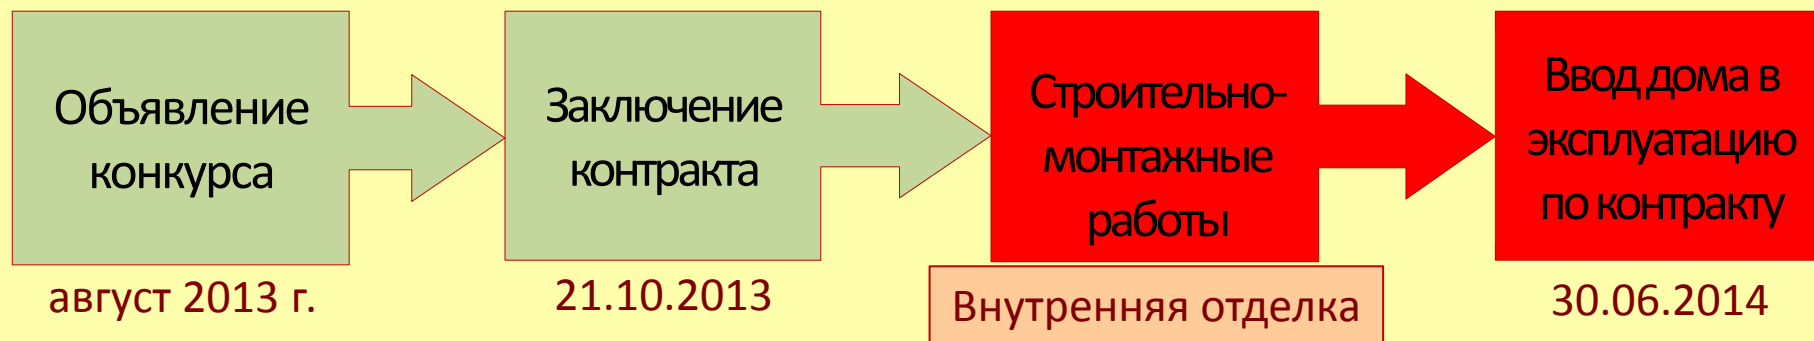

ул. Лесная, д.21



Количество переселяемых граждан – **185**

Количество расселяемых помещений – **71**

Расселяемая площадь – **2864,6 кв.м.**



# Великий Новгород, ул. Советской Армии

Объявление  
конкурса

03.08.2014

Заключение  
контракта

22.08.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

1. Устройство крыши, наружная и внутренняя отделка
2. Стены 3-ого этажа

Срок реализации

31.12.2014



Количество переселяемых граждан – **133**

Количество расселяемых помещений – **46**

Расселяемая площадь - **1845,3 кв.м.**

# Крестецкое городское поселение

Объявление  
конкурса

Заключение  
контракта

Строительно-  
монтажные  
работы

Ввод дома в  
эксплуатацию по  
контракту

август 2013 г.  
октябрь 2013 г.

09.09.2013  
22.11.2013

1. Внутренняя отделка  
2. Стены 3-ого этажа

01.04.2014  
01.09.2014

ул. Лесная



ул. Некрасова



Количество переселяемых граждан – **78**

Количество расселяемых помещений – **42**

Расселяемая площадь – **1265,8 кв.м.**

# 2014 год

Плановые показатели				Факт	
1008 человек	86 домов	545 помещений	18,98 тыс. кв. м. расселяемой площади	0	0

22 поселения в 14 муниципальных районах

Строится 36 домов

Земляные  
работы

Яжелбицкое с.п.

Завершен нулевой цикл

Великосельское с.п.  
Короцкое с.п.  
Маловишерское с.п. -1дом  
Парфинское г.п.  
Пролетарское г.п.  
г. Старая Русса  
Тёсово-Нетьильское г.п.  
Чудовское г.п.

Завершены  
строительно-  
монтажные работы

Калининское с.п.  
Маловишерское г.п.-1  
Мошенское с.п.  
Хвойнинское г.п.

Заключены  
муниципальные  
контракты

31 дом в 18  
муниципальных  
образованиях



# Большевишерское городское поселение



Количество переселяемых граждан – **53**

Количество расселяемых помещений – **27**

Расселяемая площадь – **867,0 кв.м.**

## г.Боровичи



Количество переселяемых граждан – **84**

Количество расселяемых помещений – **34**

Расселяемая площадь – **1147,74** кв.м.

# Валдайское городское поселение

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

02.07.2014

Объявление  
конкурса

21.06.2014

Заключение  
контракта

25.07.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

Фундамент

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **57**

Количество расселяемых помещений – **41**

Расселяемая площадь – **1284,02 кв.м.**



# Великосельское сельское поселение (Старорусский район)



Количество переселяемых граждан – **7**

Количество расселяемых помещений – **5**

Расселяемая площадь – **221,7 кв.м.**

# Калининское сельское поселение (Мошенской район)

Предоставление земельных участков для строительства

01.05.2014

Объявление конкурса

30.06.2014

Заключение контракта

21.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **14**

Количество расселяемых помещений – **13**

Расселяемая площадь – **366,5 кв.м.**



# Кневицкое сельское поселение (Демянский район)



Количество переселяемых граждан – **5**

Количество расселяемых помещений – **4**

Расселяемая площадь – **171,4 кв.м.**

# Короцкое сельское поселение (Валдайский район)

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

15.07.2014

Заключение контракта

15.08.2014

Строительно-монтажные работы

Фундамент

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.07.2015



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **16**

Расселяемая площадь – **553,5. кв.м.**

# Любытинское сельское поселение

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

30.05.2014

Объявление  
конкурса

27.06.2014

Заключение  
контракта

12.08.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

Стены 2-ого этажа

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

30.11.2014



Количество переселяемых граждан – **45**

Количество расселяемых помещений – **19**

Расселяемая площадь – **966,5 кв.м.**



# Маловишерское городское поселение

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

30.07.2014

Объявление  
конкурса

30.05.2014  
05.09.2014

Заключение  
контракта

08.07.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

1. Внутренняя отделка  
2. Стены 1-ого этажа

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

30.10.2014

ул. Мерецкова, д.15

ул. Заводской Домострой, д. 2



Количество переселяемых граждан – **102**

Количество расселяемых помещений – **58**

Расселяемая площадь – **1938,8 кв.м.**

# Мошенское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

21.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка – 7 домов

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

Введены в эксплуатацию - 3 дома

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **686,2 кв.м.**



# Окуловское городское поселение

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

01.03.2012

Объявление  
конкурса

01.08.2014

Заключение  
контракта

26.08.2014

Переселение  
граждан

до 30.09.2014




Количество переселяемых граждан – **15**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **226,4 кв.м.**

# Парфинское городское поселение

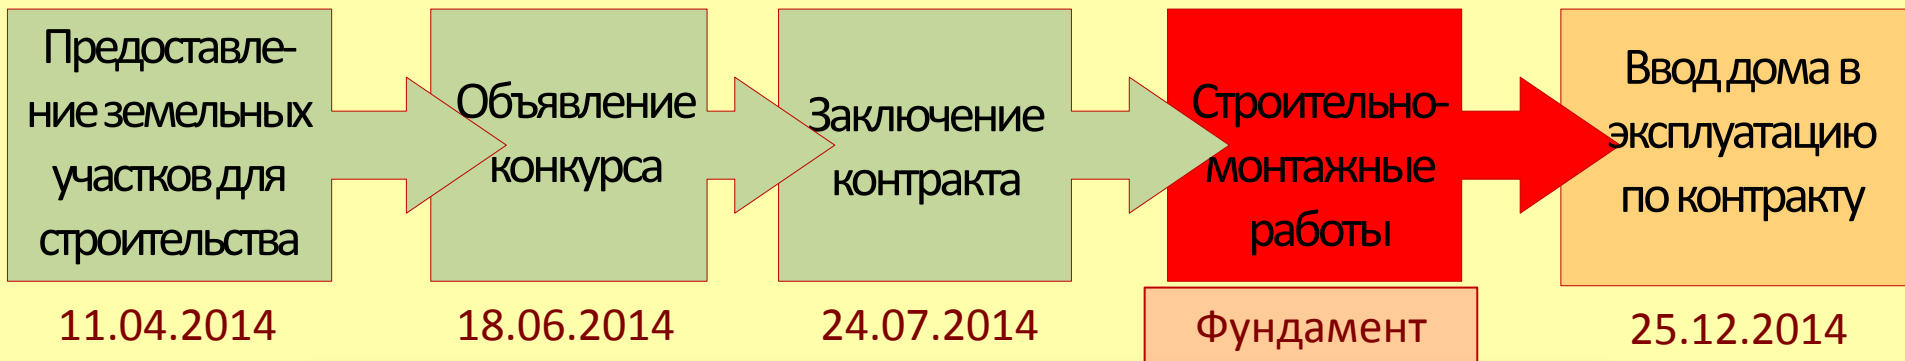

Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **972,8 кв.м.**

# Песское сельское поселение (Хвойнинский район)

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

23.06.2014

Объявление  
конкурса

08.09.2014

Заключение  
контракта

Строительно-  
монтажные  
работы

Возведение стен 2-ого этажа



Количество переселяемых граждан – **13**

Количество расселяемых помещений – **8**

Расселяемая площадь – **287,1 кв.м.**



# ***Пестовское городское поселение***

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

14.04.2014

Объявление  
конкурса

Заключение  
контракта

Строительно-  
монтажные  
работы

Устройство крыши, стены



Количество переселяемых граждан — **31**

Количество расселяемых помещений — **14**

Расселяемая площадь — **443,95 кв.м.**

# Пролетарское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

01.02.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

12.08.2014

Строительно-монтажные работы

1. Стены 1-ого этажа  
2. Фундамент

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.08.2015



Количество переселяемых граждан – **203**

Количество расселяемых помещений – **111**

Расселяемая площадь – **3739,8 кв.м.**



## г. Старая Русса



Количество переселяемых граждан – **90**

Количество расселяемых помещений – **37**

Расселяемая площадь – **1319,9 кв.м.**

# ***Тёсовское городское поселение (Новгородский район)***

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

30.04.2014

Объявление  
конкурса

30.05.2014

Заключение  
контракта

26.06.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

Стены 3-ого этажа

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **43**

Количество расселяемых помещений – **30**

Расселяемая площадь – **1190,36 кв.м.**

# Тёсово-Нетильское городское поселение




Количество переселяемых граждан – **48**

Количество расселяемых помещений – **20**

Расселяемая площадь – **913,9 кв.м.**



# Уторгошское сельское поселение (Шимский район)

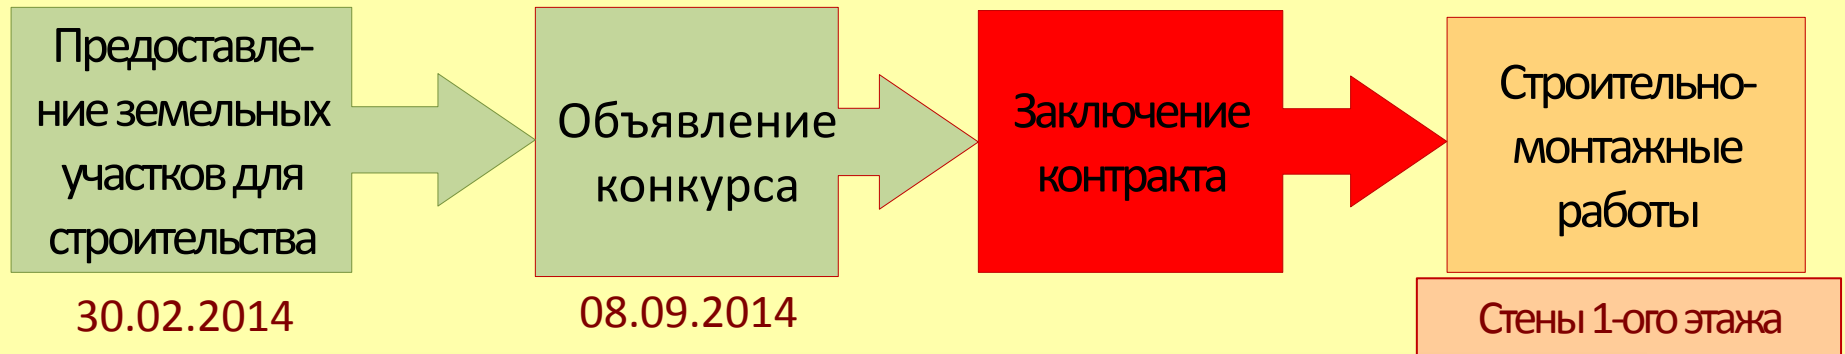

Количество переселяемых граждан – **29**

Количество расселяемых помещений – **18**

Расселяемая площадь – **602,3 кв.м.**

# Хвойнинское городское поселение

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

05.12.2013

Объявление  
конкурса

06.03.2014

Заключение  
контракта

03.04.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

Внутренняя отделка

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – 9

Количество расселяемых помещений – 4

Расселяемая площадь – 88,2 кв.м.



# Чудовское городское поселение

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

30.04.2014

Объявление  
конкурса

30.06.2014

Заключение  
контракта

14.08.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

Фундамент

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

31.12.2014



Количество переселяемых граждан – **32**

Количество расселяемых помещений – **20**

Расселяемая площадь – **732,92 кв.м.**

# Яжелбицкое сельское поселение (Валдайский район)

Предоставле-  
ние земельных  
участков для  
строительства

15.07.2014

Объявление  
конкурса

27.06.2014

Заключение  
контракта

28.10.2014

Строительно-  
монтажные  
работы

Земляные работы

Ввод дома в  
эксплуатацию  
по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **254,4 кв.м.**
