



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда

***Докладчик: Николаева Ирина Юрьевна,
руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК
Новгородской области***

2014 год

Оценка хода реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Информация предоставлена по данным ежеквартальных отчетов на 01.10.2014

1. АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

В этом разделе представлен рейтинг субъектов по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также итоговый показатель выполнения программы. Информация собрана на основании мониторинга расселения аварийного жилищного фонда, приложенного к годовому отчету о выполнении программы до 1 января 2012 года и подлежащего сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

В список «Российская Федерация» включено 49 688 аварийных домов в том числе:

жилой площадью на контроле 11 586,55 тыс кв.м.,
фактически переселено 1 069,88 тыс кв.м.,
численность переселяемых граждан 777 852 чел.,
фактически переселено граждан 71 762 чел.

[Скачать таблицу формирования индикаторов](#)

Дата расчета рейтинга субъектов: 01.10.2014

отсортировать по рейтингу ☒ по значению ☐

Москва	6	Новгородская область	29	Удмуртская область	69
Санкт-Петербург	7	Нижегородская область	31	Ленинградская область	60
Хабаровский край	8	Брянская область	33	Татарстан	61
Тамбовская область	3	Пермский край	34	Волгодонская область	62
Оренбургская область	4	Алтайский край	35	Тюменская область	63
Иркутск	5	Вологодская область	36	Самарская область	64
Ханты-Мансийский автономный округ	9	Пензенская область	37	Тверская область	65
Новосибирская область	10	Саратовская область	38	Магнитогорская область	66
Новосибирск	11	Чувашия	39	Адыгея	67
Ханты-Мансийский автономный округ	12	Балтийская область	40	Татарстан	68
Тюменская область	13	Московская область	41		
Владимирская область	14	Омская область	42		
Кемеровская область	15	Оренбургская область	43		
Ростовская область	16	Костромская область	44		
Самарская область	17	Астраханская область	45		
Кировская область	18	Калужская область	46		
Белгородская область	19	Алтайский край	47		
Ненецкий автономный округ	20	Архангельская область	48		
Липецкая область	21	Свердловская область	49		
Курганская область	22	Владимирская область	50		
Владимирская область	23	Хабаровский край	51		
Иркутская область	24	Самарская область	52		
Брянская область	25	Челябинская область	53		
Самарская область	26	Воронежская область	54		
Псковская область	27	Амурская область	55		



Фонд
РЖС



Министерство регионального
развития



Министерство регионального
развития

Место – 29 (по состоянию на 01.10.2014)

Показатель выполнения программы – 85,79 %

Объем финансирования – 1573,14 млн.руб.

Лимит средств Фонда – 737,81 млн.руб.

Площадь аварийного жилищного фонда – 54,88 тыс.м²

Численность переселяемых граждан – 3592 чел.

**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2013 г.**


2013 год

Плановые показатели				Факт	
649 человек	53 дома	296 помещений	10,4 тыс. кв. м. расселяемой площади	313 человек/ 4,850 тыс.кв.м.	48%

10 поселений и городской округ

<p>Реализованы программные мероприятия</p> <p>Мошенское с.п. Окуловское г.п. Пестовское г.п. г. Старая Русса Холмское г.п.</p>	<p>Ведется переселение граждан</p> <p>г. Боровичи – 2 Большевишерское г.п.-2 Маловишерское г.п. - 2 ВСЕГО – 6 домов</p>	<p>Завершены строительно-монтажные работы</p> <p>Маловишерское г.п. – 1 Батецкое с.п. – 1 Крестецкое г.п. – 1 ВСЕГО – 3 дома</p>	<p>Ведутся строительно-монтажные работы</p> <p>Великий Новгород-2 Крестецкое г.п. – 1 ВСЕГО – 3 дома</p>
--	---	--	--

Батецкое сельское поселение

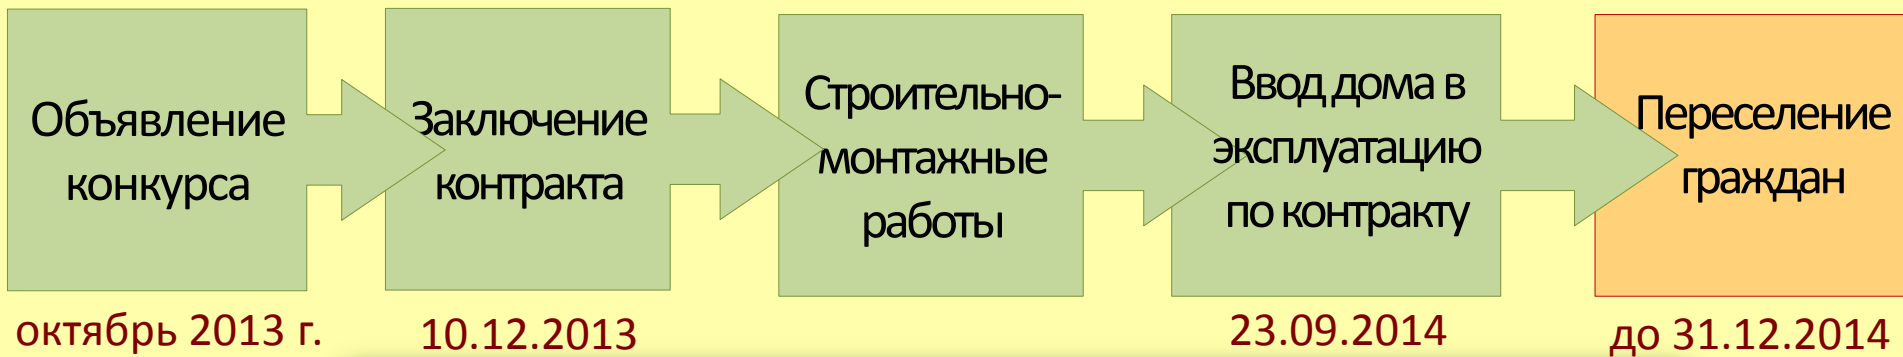


Количество переселяемых граждан – **19**

Количество расселяемых помещений – **12**

Расселяемая площадь – **220,6 кв.м.**

Маловишерское городское поселение

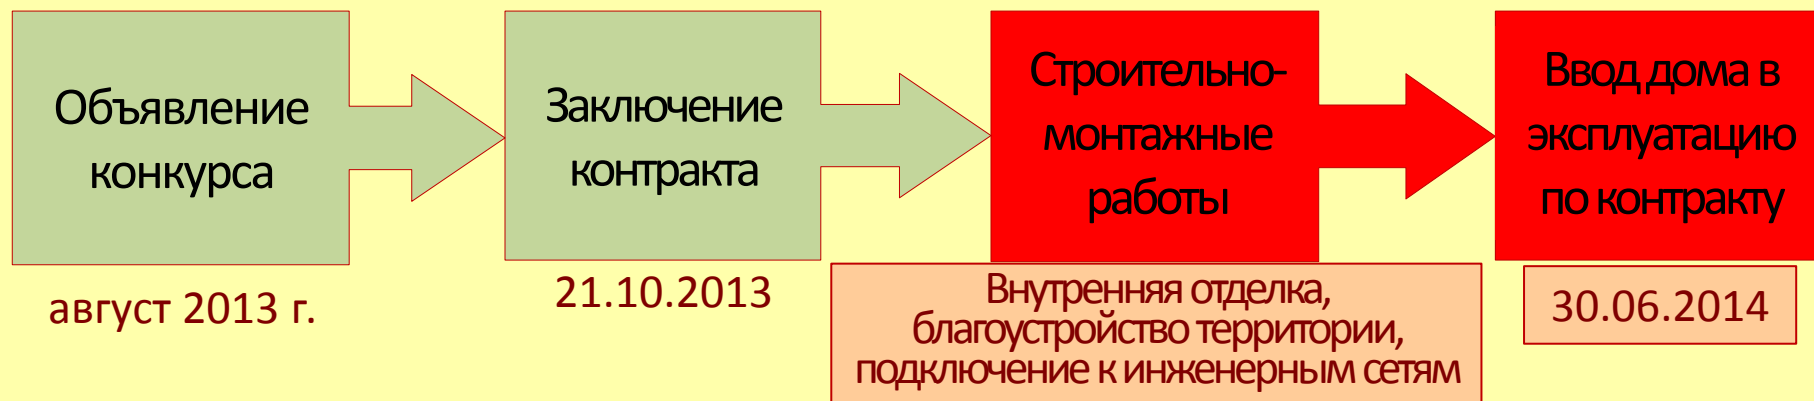

ул. Лесная, д.21



Количество переселяемых граждан – **185**

Количество расселяемых помещений – **71**

Расселяемая площадь – **2864,6 кв.м.**

Великий Новгород, ул. Советской Армии

Объявление
конкурса

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию по
контракту

24.10.2014
Повторно
03.08.2014

10.12.2013
22.08.2014

1. Внутренняя отделка, установка
сантехоборудования, подключение к
инженерным сетям
2. Устройство крыши, наружная и
внутренняя отделка

01.07.2014
15.11.2014



Количество переселяемых граждан – **133**

Количество расселяемых помещений – **46**

Расселяемая площадь - **1845,3 кв.м.**

Крестецкое городское поселение

Объявление
конкурса

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

август 2013 г.
октябрь 2013 г.

09.09.2013
22.11.2013

1. Внутренняя отделка
2. Устройство крыши

01.04.2014
01.09.2014

ул. Лесная

ул. Некрасова



Количество переселяемых граждан – **78**

Количество расселяемых помещений – **42**

Расселяемая площадь – **1265,8 кв.м.**

**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2014 г.**

2014 год

Плановые показатели				Факт	
1008 человек	86 домов	545 помещений	18,98 тыс. кв. м. расселяемой площади	0	0

21 поселение в 14 муниципальных районах

Строится 38 домов

Завершен нулевой цикл

Большевишерское с.п.- 1
 г. Боровичи - 1
 г. Валдай - 1
 Великосельское с.п. - 1
 Короцкое с.п. - 1
 Кневицкое с.п. - 1
 Любытинское с.п. - 1
 Маловишерское г.п. - 1
 Парфинское г.п. - 1
 Песское с.п. - 1
 Пестовское .п. - 3
 Пролетарское г.п. - 2
 г. Старая Русса- 2
 Тёсово-Нетильское с..п. - 2
 Уторгошское с.п. - 1
 Чудовское г.п. - 1
 Яжелбицкое с.п. - 1
Всего - 22 дома

Завершены строительно-монтажные работы

Калининское с.п.- 4
 Маловишерское г.п.-1
 Мошенское с.п. - 10
 Хвойнинское г.п. - 1
Всего – 16 домов

Заключены муниципальные контракты

в 19 муниципальных образованиях, за исключением Пестовского г.п.
 Яжелбицкого с.п. и на часть помещений в Маловишерском г.п.

Большевишерское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

22.05.2014

Объявление
конкурса

28.05.2014

Заключение
контракта

09.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Стены 2-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

15.12.2014




Количество переселяемых граждан – **53**

Количество расселяемых помещений – **27**

Расселяемая площадь – **867,0 кв.м.**

г.Боровичи

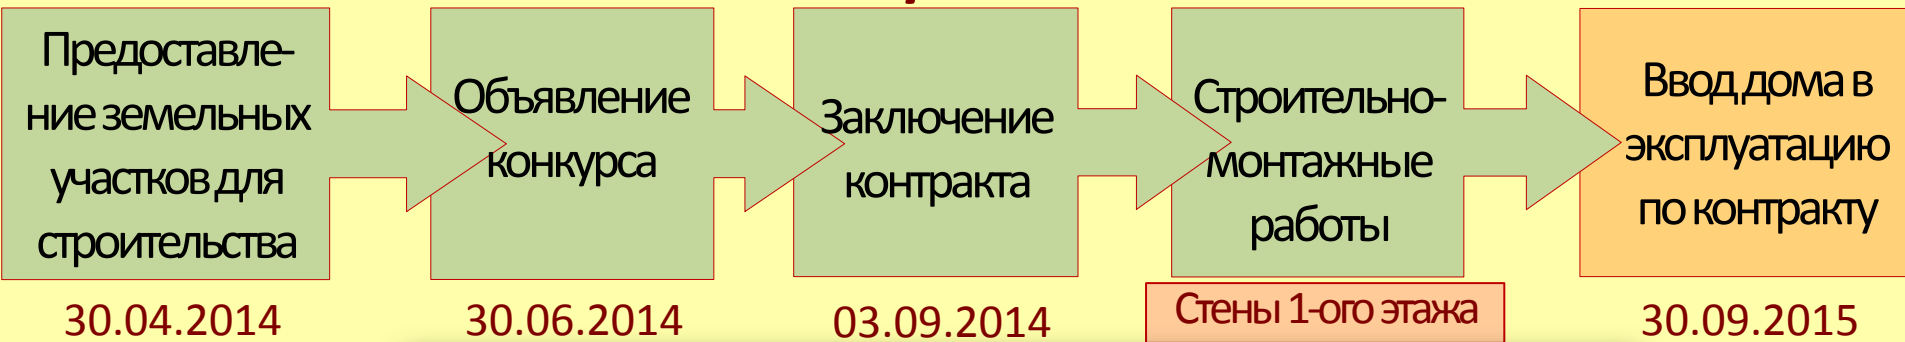

Количество переселяемых граждан – **84**

Количество расселяемых помещений – **34**

Расселяемая площадь – **1147,74** кв.м.

Валдайское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

02.07.2014

Объявление конкурса

21.06.2014

Заключение контракта

25.07.2014

Строительно-монтажные работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **57**

Количество расселяемых помещений – **41**

Расселяемая площадь – **1284,02 кв.м.**

Великосельское сельское поселение



Количество переселяемых граждан – **7**

Количество расселяемых помещений – **5**

Расселяемая площадь – **221,7 кв.м.**

Калининское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

01.05.2014

Объявление конкурса

30.06.2014

Заключение контракта

21.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка – 4 дома

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – 14

Количество расселяемых помещений – 13

Расселяемая площадь – 366,5 кв.м.

Кневицкое сельское поселение



Количество переселяемых граждан – 5

Количество расселяемых помещений – 4

Расселяемая площадь – **171,4 кв.м.**

Короцкое сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

15.07.2014

Заключение контракта

15.08.2014

Строительно-монтажные работы

Фундамент

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.07.2015



Количество переселяемых граждан — 35

Количество расселяемых помещений — 16

Расселяемая площадь — 553,5. кв.м.

Любытинское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.05.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

12.08.2014

Строительно-монтажные работы

Стены 3-ого этажа

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.11.2014




Количество переселяемых граждан – **45**

Количество расселяемых помещений – **19**

Расселяемая площадь – **966,5 кв.м.**

Маловишерское городское поселение

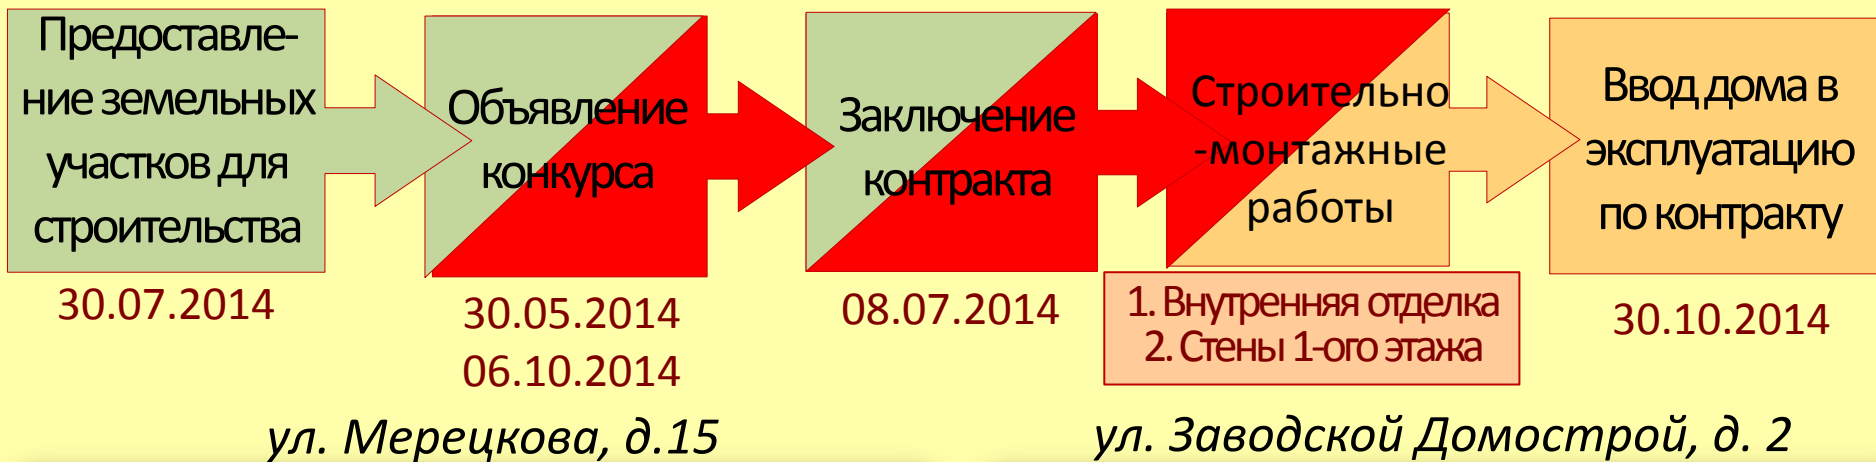

Количество переселяемых граждан – **102**
Количество расселяемых помещений – **58**
Расселяемая площадь – **1938,8 кв.м.**

Мошенское сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

21.07.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка – 7 домов

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

Введены в эксплуатацию - 3 дома

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **686,2 кв.м.**

Парфинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

11.04.2014

Объявление
конкурса

18.06.2014

Заключение
контракта

24.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

25.12.2014



Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **972,8 кв.м.**

Песское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

23.06.2014

Объявление
конкурса

08.09.2014

Заключение
контракта

07.10.2014

Строительно-
монтажные
работы

Крыша

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

15.11.2014



Количество переселяемых граждан – **13**

Количество расселяемых помещений – **8**

Расселяемая площадь – **287,1 кв.м.**

Пестовское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

14.04.2014

Объявление
конкурса

13.10.2014

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Внутренняя отделка – 3 дома



Количество переселяемых граждан – **31**

Количество расселяемых помещений – **14**

Расселяемая площадь – **443,95 кв.м.**

Пролетарское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

01.02.2014

Объявление
конкурса

27.06.2014

Заключение
контракта

12.08.2014

Строительно-
монтажные
работы

1. Стены 1-ого этажа
2. Фундамент

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

31.08.2015



Количество переселяемых граждан – **203**

Количество расселяемых помещений – **111**

Расселяемая площадь – **3739,8 кв.м.**

г. Старая Русса



Количество переселяемых граждан – **90**

Количество расселяемых помещений – **37**

Расселяемая площадь – **1319,9 кв.м.**

Тёсово-Нетильское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

Объявление конкурса

Заключение контракта

Строительно-монтажные работы

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.04.2014
30.04.2014

30.06.2014
30.05.2014

28.07.2014
26.06.2014

1.Фундамент
2.Крыша, внешняя отделка

31.12.2014
01.12.2014




Количество переселяемых граждан – **91**

Количество расселяемых помещений – **50**

Расселяемая площадь – **2104,26 кв.м.**

Уторгошское сельское поселение

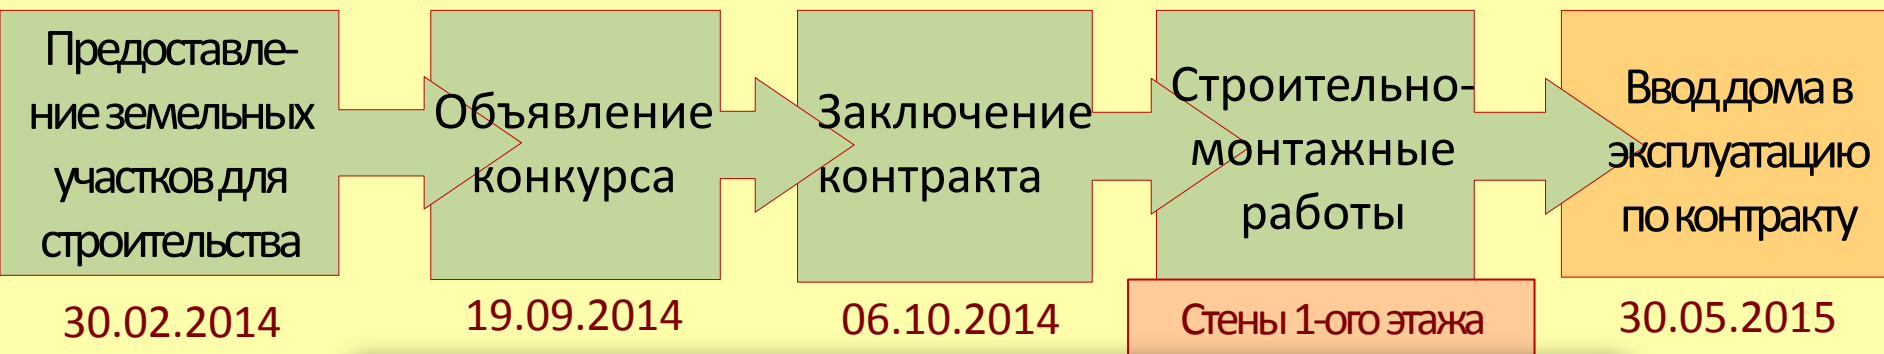

Количество переселяемых граждан – **29**

Количество расселяемых помещений – **18**

Расселяемая площадь – **602,3 кв.м.**

Хвойнинское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

05.12.2013

Объявление конкурса

06.03.2014

Заключение контракта

03.04.2014

Строительно-монтажные работы

Внутренняя отделка

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

01.12.2014



Количество переселяемых граждан – 9

Количество расселяемых помещений – 4

Расселяемая площадь – 88,2 кв.м.

Чудовское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

30.04.2014

Объявление
конкурса

30.06.2014

Заключение
контракта

14.08.2014

Строительно-
монтажные
работы

Стены 1-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

31.12.2014



Количество переселяемых граждан – **32**

Количество расселяемых помещений – **20**

Расселяемая площадь – **732,92 кв.м.**

Яжелбицкое сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

15.07.2014

Объявление
конкурса

22.09.2014

Заключение
контракта

Строительно-
монтажные
работы

Фундамент



Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **254,4 кв.м.**
