

**Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области,
из аварийного жилищного фонда
ЭТАП 2014 г.**

2014 год

| Плановые показатели | | | | Факт | |
|---------------------|-------------|------------------|---|--------------------------------|------|
| 832 человек | 69 домов | 447 помещений | 15,38 тыс. кв. м. расселяемой площади | 174 человек/ 3,51 тыс.кв.м. | 23 % |

21 поселение в 14 муниципальных районах

39 домов

Завершен нулевой цикл

г. Боровичи - 1
г. Валдай - 1
Короцкое с.п. - 1
Парфинское г.п. - 1
Пролетарское г.п. - 2
г. Старая Русса - 2
Тёсово-Нетельское с.п. - 1
Яжелбицкое с.п. - 1
Всего – 10 домов


Завершено строительство

Маловишерское г.п.-2
Тёсово-Нетельское с.п. – 1
Уторгошское с.п. – 1
Большевишерское г.п. -1
Чудовское г.п. - 1
Всего домов – 6

Реализованы программные мероприятия

Великосельское с.п. - 1
Калининское с.п.- 4
Кневицкое с.п. – 1
Любытинское с.п. - 1
Мошенское с.п. – 10
Песское с.п. – 1
Пестовское .п. - 3
Хвойнинское г.п. -1
Окуловское г.п. - 1
Всего домов – 23

г.Боровичи

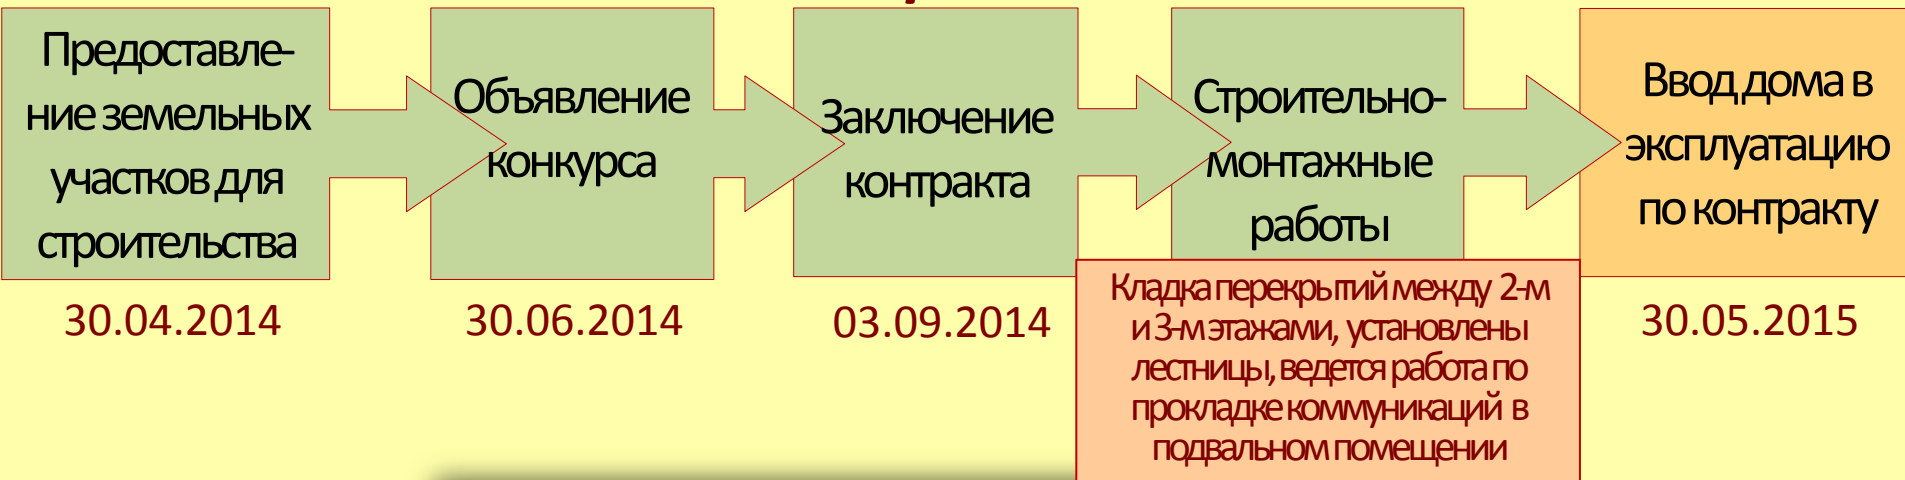

Количество переселяемых граждан – **84**

Количество расселяемых помещений – **34**

Расселяемая площадь – **1147,74** кв.м.

Валдайское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

02.07.2014

Объявление конкурса

21.06.2014

Заключение контракта

25.07.2014

Строительно-монтажные работы

Возведение стен 3-го этажа, устройство крыши, монтаж электрооборудования, возведение межкомнатных стен 3-его этажа, устройство инженерных сетей (отопления), утепление чердачного помещения

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **57**

Количество расселяемых помещений – **41**

Расселяемая площадь – **1284,02 кв.м.**

Короцкое сельское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

30.06.2014

Объявление конкурса

15.07.2014

Заключение контракта

15.08.2014

Строительно-монтажные работы

Устройство крыши, завершается кладка внутренних межквартирных перегородок

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

30.07.2015



Количество переселяемых граждан – **35**

Количество расселяемых помещений – **16**

Расселяемая площадь – **553,5 кв.м.**

Парфинское городское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

11.04.2014

Объявление
конкурса

18.06.2014

Заключение
контракта

24.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

Устройство крыши

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

25.12.2014



Количество переселяемых граждан – **46**

Количество расселяемых помещений – **26**

Расселяемая площадь – **972,8 кв.м.**

Пролетарское городское поселение

Предоставление земельных участков для строительства

01.02.2014

Объявление конкурса

27.06.2014

Заключение контракта

12.08.2014

Строительно-монтажные работы

1. Устройство крыши
2. Стены 1-го этажа

Ввод дома в эксплуатацию по контракту

31.08.2015



Количество переселяемых граждан – **203**

Количество расселяемых помещений – **111**

Расселяемая площадь – **3739,8 кв.м.**

г. Старая Русса



Количество переселяемых граждан — **90**
Количество расселяемых помещений — **37**
Расселяемая площадь — **1319,9 кв.м.**

Тёсово-Нетильское сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

30.04.2014

Объявление
конкурса

30.06.2014

Заключение
контракта

28.07.2014

Строительно-
монтажные
работы

1. Стены 1-ого этажа

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

31.12.2014



Количество переселяемых граждан — **63**

Количество расселяемых помещений — **37**

Расселяемая площадь — **1499,16 кв.м.**

Яжелбицкое сельское поселение

Предоставле-
ние земельных
участков для
строительства

15.07.2014

Объявление
конкурса

22.09.2014

Заключение
контракта

06.11.2014

Строительно-
монтажные
работы

Монтаж вентилируемого
фасада, кладка внутренних
межквартирных перегородок,
монтаж внутренней
электропроводки

Ввод дома в
эксплуатацию
по контракту

30.03.2015



Количество переселяемых граждан – **12**

Количество расселяемых помещений – **7**

Расселяемая площадь – **254,4 кв.м.**
